

INWESTOR:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

DOTYCZY:

PROTOKÓŁ POMIARÓW WENTYLACJI

**I MODERNIZACJA AUTOMATYKI I CENTRALI WENTYLACJI ORAZ
SYSTEMU DYSTRYBUCJI W OBIEKCIE HALI SPORTOWEJ
PRZY UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 40 W WARSZAWIE**


BIURO PROJEKTOWE:



ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa
Tel./fax (22) 674 11 66
biuro@elbas.com.pl

PROTOKOŁY

- 1. Protokół pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej**
 - 2. Protokół kontroli szczelności instalacji agregatu nr 1**
 - 3. Protokół kontroli szczelności instalacji agregatu nr 2**
 - 4. Protokół uruchomienia automatyki centrali wentylacyjnej NW1 – VBW 27000**
 - 5. Protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania**
 - 6. Protokół rezystancji izolacji elektrycznych**
-



INWESTOR:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

DOTYCZY:

PROTOKÓŁ POMIARÓW WENTYLACJI

**I MODERNIZACJA AUTOMATYKI I CENTRALI WENTYLACJI ORAZ
SYSTEMU DYSTRYBUCJI W OBIEKCIE HALI SPORTOWEJ
PRZY UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 40 W WARSZAWIE**

BIURO PROJEKTOWE:



ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa
Tel./fax (22) 674 11 66
biuro@elbas.com.pl

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

STADIUM:

Dokumentacja powykonawcza

BRANŻA:


Sanitarna - wentylacja i klimatyzacja

OPRACOWALI:

mgr inż. Kamil Malarczyk, nr upr. LUB/0091/OWOS/14

mgr inż. Michał Młynarczyk

III 2021



ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Nr świadectwa: 0147/TA/00211/20

Data wydania: 22/09/2020r.



PRZEDMIOT SPRAWDZENIA	Termoanemometr KIMO VT100
NR SERYJNY	1P140610246
ZGŁASZAJĄCY	ELBAS sp. z o.o. sp.k ul. Echa Leśnego 16 03-257 Warszawa
DATA WZORCOWANIA	22/09/2020r.
METODA SPRAWDZENIA	Wg procedury sprawdzania przyrządów pomiarowych wentylacji nr 1/2011 wersja 1.2.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura otoczenia – $(20,0 + 25,0)$ °C Wilgotność względna powietrza – $(40,0 + 60,0)$ %RH Ciśnienie atmosferyczne – $(990 + 1025)$ hPa
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Świadectwo potwierdza spójność wyników pomiarów w odniesieniu do państwowych lub międzynarodowych wzorców jednostek miar
WYNIKI WZORCOWANIA	Podano na stronie nr 2 świadectwa wraz z niepewnością pomiaru.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02M:2013 Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone, Przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

MERSERWIS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.



Metrolog

Marcin Dąbrowski

Sprawdził



MERSERWIS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

www.merserwis.pl | ul. Andersa 10 | 00-201 Warszawa

ul. Gen. Andersa 10 | 00-201 Warszawa

tel. 22 831 25 21 | 22 831 42 56

REGON 142494 | KRS 0000406516 | NIP 5260058571

Zatwierdził

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.

1 / 2



ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Nr świadectwa: 0147/TA/00211/20

Data wydania: 22/09/2020r.

WYNIKI


WZORCOWANIA

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono poniżej

Zakresy pomiarowe: 0,15 m/s – 3,00 m/s : rozdzielczość 0,01
3,1 m/s – 30,0 m/s : rozdzielczość 0,1
-20 do +80°C : rozdzielczość 0,1

Nr.	Wartość odniesienia		Wskazanie wzorcowanego przyrządu		Poprawka	Niepewność pomiaru
	V wz.	Jednostka	Vi	Jednostka	DV = V wz. - Vi	-
1	0,53	m/s	0,49	m/s	0,04	0,08
2	2,04	m/s	1,80	m/s	0,22	0,19
3	8,13	m/s	8,0	m/s	0,05	0,39
4	17,90	m/s	17,9	m/s	-0,18	0,49
5	22,32	m/s	22,7	m/s	-0,61	0,54

Liniowa aproksymacja charakterystyki przyrządu:
 $V = 0,9807 \cdot Vi + 0,2026$

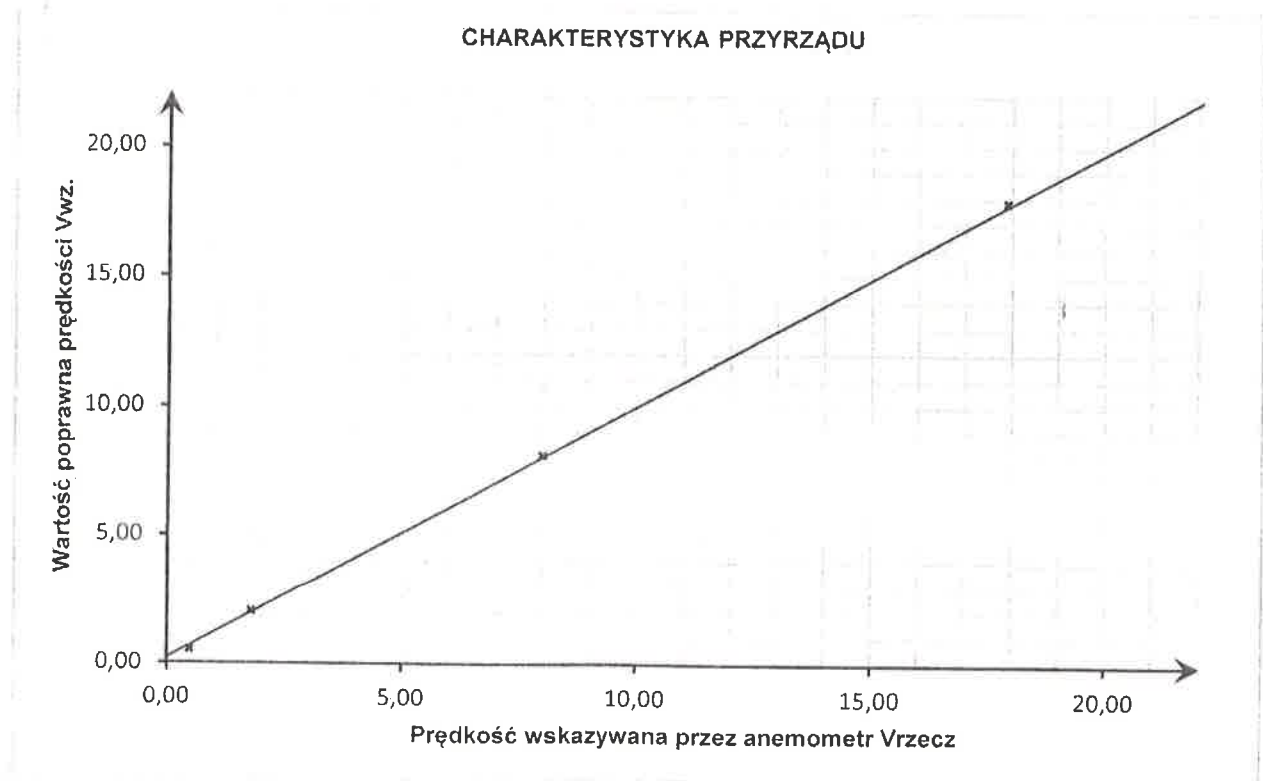


Punkt kontrolny temperatury:

Wartość zadana	Wartość odczytana
°C	°C
22,9	22,6

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

K. Polak



1. POMIAR SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana w oparciu o :

- Zlecenie wykonania pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej.
- Dokumentacja powykonawcza instalacji NW1.
- Obowiązujące normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zbadanie skuteczności działania zespołów wentylacji mechanicznej pod względem wydajności powietrza nawiewanego przez nowozamontowane nawiewniki na instalacji NW1. Opracowanie ma potwierdzić poprawność wyregulowania w/w instalacji.

W zakresie opracowania zawiera się:

- Wykonanie pomiarów przepływu powietrza na kanałach zbiorczych.
- Wykonanie pomiarów przepływu powietrza na kanałach indywidualnych poszczególnych elementów nawiewnych i wywiewnych.
- Sporządzenie protokołu skuteczności działania instalacji.

1.3. Metodyka pomiarów

Objętościowy strumień powietrza pomierzono pośrednio poprzez pomiar strumienia powietrza w kanałach wentylacyjnych instalacji NW1 i pomiar elektroniczny poprzez wentylator centrali wentylacyjnej. Przepływu powietrza V dla pomiaru pośredniego w kanale obliczono ze wzoru:

$$V = F \cdot v_{\text{sr}} \cdot 3600 [m^3/h]$$


gdzie:

F – pole przekroju pomiarowego brutto, $[m^2]$

v_{sr} – średnia prędkość przepływu powietrza, $[m/s]$

1.4. Narzędzia pomiarowe

Pomiarów dokonano wielofunkcyjnym miernikiem VT 100S nr seryjny 1P140610246 z termorezystorem z współczynnikiem temperaturowym i czujnikiem termo-oporowym. Zakres pomiarowy: 0,15 do 30m/s. Rozdzielczość 0,01 m/s, powyżej 3m/s 0,1m/s, zakres pomiarowy temperatury -20 do 80°C, rozdzielczość 0,1



1.5. Wyniki pomiarów

L.p.	System	Punkt pomiarowy	Nazwa pomieszczenia	NAWIEW		RÓŻNICA	WYWIEW		RÓŻNICA
				projektowany	zmierzony	%	projektowany	zmierzony	%
-				m3/h	m3/h	%	m3/h	m3/h	%
1	NW1	N1.1	Płyta hali sportowej	1350	1460	8%			
2	NW1	N1.2		1350	1430	6%			
3	NW1	N1.3		1350	1225	-9%			
4	NW1	N1.4		1350	1150	-15%			
5	NW1	N1.5		1350	1480	10%			
6	NW1	N1.6		1350	1435	6%			
7	NW1	N1.7		1350	1265	-6%			
8	NW1	N1.8		1350	1430	6%			
9	NW1	N1.9		1350	1230	-9%			
10	NW1	N1.10		1350	1360	1%			
			Σ	13500	13465	-2%	0	0	nd
			NW1	13500	13220	-2%	0	0	nd



1.6. Wnioski

Wnioski wynikające z przeprowadzonych pomiarów wydajności instalacji wentylacji mechanicznej

1. Odchyłki wartości zmierzonych przepływów powietrza instalacji NW1 nie przekraczają wartości 10%.
2. Instalacja NW1 są wyregulowane w sposób prawidłowy. Wydatki objętościowych strumieni powietrza w poszczególnych elementach nawiewnych i wywiewnych w stosunku do zaprojektowanych nie przekraczają 20% odchyłki.

Pomiary i obliczenia wykonali:

1. mgr inż. Kamil Malarczyk nr upr. LUB/0091/OWOS/14
2. mgr inż. Michał Młynarczyk

mgr inż. Kamil Malarczyk
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. inżyn. LUB/0091/OWOS/14
nr członkowski: LUB/IS/0240/14

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Protokół z kontroli szczelności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1516/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.

ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy
cieplarniane

Nazwa instalacji: Remont klimatyzacji I Numer fabryczny:

Właściciel: MARIA SZKODNA WIE BIEGOSTA Adres: OSIEDLE SW. MARIKI 42, ul. WILKOPOLESKA

Operator: J.W. Adres: J.W.

1. Kontrola dokumentacji

Istnieje / brak, kompletna / nie-kompletna¹⁾ Uwagi:

2. Stopień zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła:

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

3. Ocena parametrów działania Urządzenia:

- Ciśnienie ssania Ps wartość 6,5 bar w normie / poza normą¹⁾
- Ciśnienie skraplania Pk wartość 30 bar w normie / poza normą¹⁾
- Temperatura parowania To wartość 0 °C w normie / poza normą¹⁾
- Temperatura skraplania To wartość 40 °C w normie / poza normą¹⁾
- Przegrzanie par w parowniku wartość 6 K w normie / poza normą¹⁾
- Dochłodzenie cieczy w skraplaczu wartość 5 K w normie / poza normą¹⁾
- Napięcie zasilania U = 400 V w normie / poza normą¹⁾
- Pobór prądu sprężarki I = 40 A In = 80 A w normie / poza normą¹⁾

4. Stan montażu aparatury bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

5. Kontrola drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienie
bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

6. Stan techniczny podpór i zamocowań:
bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

7. Stan techniczny i szczelność spawów, lutów i połączeń:
bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

8. Stan techniczny izolacji termicznej
bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

inne

1)- niepotrzebne skreślić

9. Stan techniczny i szczelność uszczelnień
bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

10. Stan techniczny i szczelność zaworów:
bez zastrzeżeń, zgodnie ze schematem / Uwagi¹⁾:

11. Prawidłowość zamontowania i działania oraz szczelność przełączników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem:

- ✓ Presostat niskiego ciśnienia nastawa 5 bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Presostat wysokiego ciśnienia nastawa 45 bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Presostat bezpieczeństwa nastawa bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Zawór bezpieczeństwa nastawa bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾ nie szczelny

12. Kontrola korozji i szczelności :

- ✓ Przewodów rurowych bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Elastycznych połączeń bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Parownik bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Skraplacz bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Inne bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾

13. Kontrola szczelności zastosowaną metoda bezpośrednią :

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾ opis zastosowanej metody

Pomiar przy pomocy Testa

Przyrząd, metoda użyty(a)¹⁾ do bezpośredniej kontroli szczelności:

producent: Testa typ: 316-6 czułość: 5 g/rok

data ważności świadectwa sprawdzenia detektora nieszczelności

Próba szczelności za pomiotu gazu obojętnego konieczna / ~~nie konieczna~~¹⁾

Wynik próby szczelności za pomocą gazu obojętnego :

POZYTYWNY / NEGATYWNY¹⁾

Sprawdzenia dokonał : Janek Bisk

Podpis

Nr Certyfikatu 1010-14/2013/19 data ważności Certyfikatu

Powyższe prace odebrał:

data / podpis

Protokół z kontroli szczelności.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1516/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.

ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

Nazwa instalacji: Wyregulacja chłodnicy II Numer fabryczny:
Właściciel: MALA SIOBRAWA OSIR BENEWS Adres: GRANICZNA JABRUKA 10 14 14, 1410000
Operator: J.W Adres: J.W

1. Kontrola dokumentacji

Istnieje / brak, kompletna / nie kompletna¹⁾ Uwagi:

2. Stopień zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła:

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

3. Ocena parametrów działania Urządzenia:

- | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • Ciśnienie ssania | Ps | wartość <u>6.8</u> bar | w normie / poza normą ¹⁾ |
| • Ciśnienie skraplania | Pk | wartość <u>3.2</u> bar | w normie / poza normą ¹⁾ |
| • Temperatura parowania | To | wartość <u>0</u> °C | w normie / poza normą ¹⁾ |
| • Temperatura skraplania | To | wartość <u>4.0</u> °C | w normie / poza normą ¹⁾ |
| • Przegrzanie par w parowniku | | wartość <u>4</u> K | w normie / poza normą ¹⁾ |
| • Dochłodzenie cieczy w skraplaczu | | wartość <u>-</u> K | w normie / poza normą ¹⁾ |
| • Napięcie zasilania | U = | <u>100</u> V | w normie / poza normą ¹⁾ |
| • Pobór prądu sprężarki | I = | <u>5.2</u> A In = <u>8.2</u> A | w normie / poza normą ¹⁾ |

4. Stan montażu aparatury : bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

5. Kontrola drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienie

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

6. Stan techniczny podpór i zamocowań:

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

7. Stan techniczny i szczelność spawów, lutów i połączeń:

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

8. Stan techniczny izolacji termicznej

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾:

inne

9. Stan techniczny i szczelność uszczelnień bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾ :

10. Stan techniczny i szczelność zaworów: bez zastrzeżeń, zgodne ze schematem / Uwagi¹⁾:

11. Prawidłowość zamontowania i działania oraz szczelność przełączników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem:

- ✓ Presostat niskiego ciśnienia nastawa 3 bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Presostat wysokiego ciśnienia nastawa 4,5 bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Presostat bezpieczeństwa nastawa bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Zawór bezpieczeństwa nastawa bar bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾nie szczelny.....

12. Kontrola korozji i szczelności :

- ✓ Przewodów rurowych bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Elastycznych połączeń bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Parownik bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Skraplacz bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾
- ✓ Inne bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾

13. Kontrola szczelności zastosowaną metodą bezpośrednią :

bez zastrzeżeń / Uwagi¹⁾ opis zastosowanej metody

Pomiar przyrządami Testo

Przyrząd, metoda użyty(a)¹⁾ do bezpośredniej kontroli szczelności:

producent: Testo typ: 316-4 czułość: 5 g/rok

data ważności świadectwa sprawdzenia detektora nieszczelności

Próba szczelności za pomiotu gazu obojętnego konieczna / nie konieczna¹⁾

Wynik próby szczelności za pomocą gazu obojętnego :

POZYTYWNY / NEGATYWNY¹⁾

Sprawdzenia dokonał : Emil Błk
Podpis

Nr Certyfikatu 1043077/10/11 data ważności Certyfikatu

Powyższe prace odebrał:

data / podpis

1) - niepotrzebne skreślić



AP ELBAS

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

• KONTROLA WYKONANIA • KONTROLA WYKONANIA • SYSTEMY KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Obiekt:	HALA SPORTOWA CSIK BEMOW		
Adres:	OBRONCÓW TWORZYKÓW 01-494 WARSZAWA		
Data:	05.2021	Nr centrali:	SK-1220-273

Tryb pracy	Wydajność		Ciśnienia					
	Wywiew	Nawiew	Czerpnia-nawiew [Pa]	Wywiew-wyrzutnia [Pa]	Czerpnia-atmosfera [Pa]	Nawiew-atmosfera [Pa]	Wyrzutnia-atmosfera [Pa]	Wywiew-atmosfera [Pa]
Osuszanie lato [m3/h]	2700	2700	305	420	25	280	60	360
I[A] (parametr falownik)	22	27						
Częstotliwość (czyste filtry) [Hz]	60	80						
Kalibracja +/-hp	/							
Kalibracja +/-tp	-1,0							
Kalibracja +/-tn	-1,5							
Kalibracja +/-tz	-1,0							
Kalibracja +/-tw	-3,0							
Kalibracja +/-tcz	1,0							
Kalibracja +/-tpn	2,5							
podciśnienie hala	TAK							
podciśnienie czerpnia	/							
tcz[°C] Zr=100%, centrala wyłączona	32°C							
Wymiana filtrów:	NIE							

AP ELBAS

Napięcie zasilające		
L1[V]	L2[V]	L3[V]
230	230,5	228,5

Uwagi:

Podpis:

Emil Bgk

Protokół nr.1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (wyłączniki, bezpieczniki)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Wykonawca: AP ELBAS Sp. Z o.o. Sp. K.
Echa Leśne 16
03-257 Warszawa

Inwestycja: Hala Sportowa OSIR Bemowo

Adres: Obrońców Tobruku 40,
01-494 Warszawa

Inwestor: Hala Sportowa OSIR Bemowo
Obrońców Tobruku 40,
01-494 Warszawa

Data wykonania pomiarów: 05.03.2021r.

Przyrząd pomiarowy : Metrel 3102H BT EurotestXE

Świadectwo wzorcowania : nr 0539/MIE/2006055 z dn. 18.06.20r.

Układ sieci : TN-C-S

$t_a[s]$ (0.2, 0.4, 5) : 0.4

$U_0 [V]$: 230V/400V

Legenda:

I_n – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego;

I_a – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie;

Z_{spom} – impedancja pętli zwarcia zmierzona;

Z_{sdop} – impedancja pętli zwarcia dopuszczalna $Z_{sdop} = U_o / I_a$;

t_a – Maksymalny czas wyłączenia;

U_o – Napięcie fazowe sieci;

Lp.	Pomieszczenie	Opis obwodu	Typ zabezpieczenia	I_n [A]	I_a [A]	Z_{spom} [Ω]	Z_{sdop} [Ω]	t_a [s]	Ocena skuteczności ochrony ($Z_{spom} \leq Z_{sd}$) TAK/NIE
1	Przy cent. wenty	ZAS. 1	C80	80	800	0,3	0,5	0,4	TAK
2	Przy cent. wenty	ZAS. 1	C80	80	800	0,29	0,5	0,4	TAK

Uwagi:

Ogólny wynik próby: **POZYTYWNY**

Instalacja nadaje się do użytkowania: **TAK**

Pomiar wykonali:

AP ELBAS Sp. z o.o. Sp.k.
Emit Baka
Nr. Licz. 511/E-1723/2013
Nr. Licz. 501/D-1898/2018
FGAZ-D/127/00231/19

Protokół nr.2

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznych

Wykonawca: AP ELBAS Sp. Z o.o. Sp. K.
Echa Leśne 16
03-257 Warszawa

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Inwestycja: Hala Sportowa OSIR Bemowo

Adres: Obrońców Tobruku 40,
01-494 Warszawa

Inwestor: Hala Sportowa OSIR Bemowo
Obrońców Tobruku 40,
01-494 Warszawa

Data wykonania pomiarów: 05.03.2021r.

Przyrząd pomiarowy : Metrel 3102H BT EurotestXE

Świadectwo wzorcowania : nr 0539/MIE/2006055 z dn. 18.06.20r.

Temperatura podczas pomiarów: ~24°C

Napięcie nominalne obwodu: <500V

Napięcie probiercze: 1000V, 2500V

Układ sieci: TN-C-S

Lp	Opis obwodu	Typ przewodu	Zmierzona rezystancja izolacji [MΩ]										Minimalna rezystancja izolacji [MΩ]/spełnienie warunków normy	
			L1-L2	L1-L3	L2-L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE		
1.	ZAS 1	JB 750 5G10	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	≥1MΩ/TAK
2.	ZAS 2	JB 750 5G10	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	≥1MΩ/TAK

Uwagi: Brak

Ogólny wynik próby: **POZYTYWNY**

Instalacja nadaje się do użytkowania: **TAK**

Pomiar wykonali:

AP ELBAS Sp. z o.o. Sp.k.
 Emil Bak
 Nr Upr. 681/E/1899/2018
 Nr Upr. 681/D/1899/2018
 FGAZ-0-27/00231/19
